

114 年 1 月至 3 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	專管單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	長億高中大愛樓廁所修繕工程	臺中市立長億高級中學		禾森建築師事務所	瑞晟土木包工業有限公司	磁磚完成面不平整，未對縫。(扣 2 點)【M】(5.08.01)	2
2	臺中市文心森林公園公共廁所本體與周邊改造工程	臺中市養護工程處		王銘顯建築師事務所	軍威營造有限公司	1. (1)污廢水管之配管未依設計圖施工，且現場施工將廢水管直接排至水溝，未符合兩污水分流；(2)施作之污水管配管，未考量尚未施作之平行廢水管配管，將會造成污廢水管之配管洩水坡度不足。(扣 2 點)【M】(5.07.05.04) 2. 已施工之污廢水管，未依設計圖施作通氣管，且既設之污水處理設施未銜接通氣管。(扣 1 點)【M】(5.07.05.09) 3. 現場臨時用電設備未裝設漏電斷路器。(扣 2 點)【M】(5.14.03.02)	5
3	太平區清潔隊辦公廳舍暨停車場興建工程	臺中市政府環境保護局		陳彥銘建築師事務所	榮家建設有限公司	A 棟主體建物灌漿完成面未依圖說施作，如有優化工法應依規提報監造單位及主辦機關，並落實於工務會議或提出變更等，提出相關工法及材料證明，並獲監造及主辦機關同意後施作，現場未見相關紀錄及該材料之證明等。(扣 2 點)【M】(5.01.99)	2
4	「臺中市和平區左棟衛生所拆除重建工	臺中市政府衛生局		徐英豪建築師事務所	煜昇營造有限	1. 兩底鋼筋排列不妥適(無相關設計圖說及施工圖可做為施工依據)，部份排列成雙層筋，部份排	3

項次	工程名稱	主辦單位	專管單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
	程」採購案				公司	列成單層筋，且外牆澆置混凝土時未與雨庇同時澆築，本工程採分次澆築較無法達到一體成型效果； 2. 抽查三 F 外牆預留之牆筋有漏排或間距過大情形。(扣 3 點)【M】(5.02.02)	
5	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	臺中市政府水利局		德眾工程顧問股份有限公司	磐鴻環境科技有限公司 璿澧營造有限公司	施工安全衛生履約事項未落實執行： 1. 本工程屬高差 2 公尺以上之工作場所（谷關水資源回收中心）未確實設置符合規定上下設備、工地現場開口處亦未確實設置符合規定之防墜設施。 2. 施工架無交叉拉桿、防墜網，部份施工架無扶手。(扣 3 點)【M】(5.14.01.01)	3
6	臺中市大雅區中山北路雨水下水道新建暨改建工程	臺中市政府水利局		禹安工程顧問股份有限公司	勝億營造有限公司	臨時性瀝青鋪面壓實度不平整，不符合規範，請改善。(扣 3 點)【M】(5.07.02.11)	3

排水、污水等管路施工常見缺失宣導事項




依用戶用電設備裝置規則，電器設備管線明管不得使用 CD 軟管。(5.07.05.04)



1. 依用戶用電設備裝置規則辦理，設計階段應明確於圖說及規範標示管材規格。
2. 落實材料設備送審、進場檢查及施工階段確認。
3. 電器設備管線明管建議可使用金屬可撓導線管。



管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。(5.07.05.10)

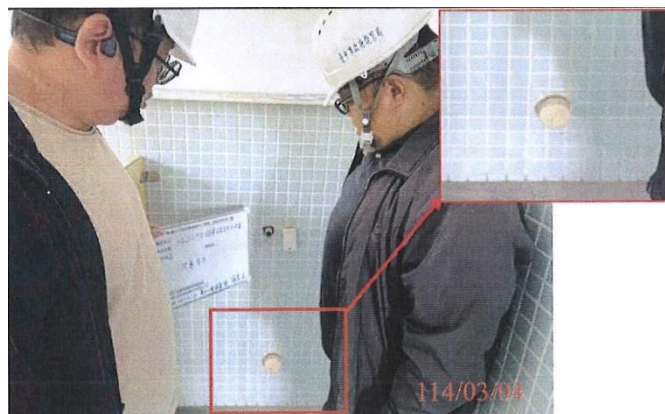

排水孔預留管加帽蓋保護。
