
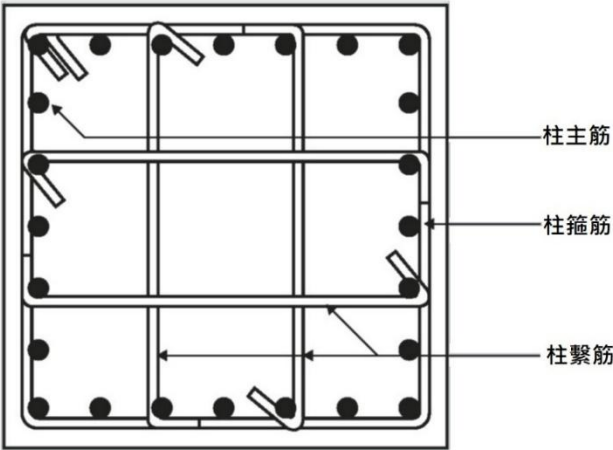


## 114 年 10 月至 12 月 工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	專管單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	臺中市政府教育局		張景堯建築師事務所	一六營造股份有限公司	二樓牆柱、一樓坡道短梁鋼筋，主筋與箍筋未設置與綁紮固定確實，箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求。(扣 3 點)【M】(5.02.01)	3

### 鋼筋施工常見缺失宣導事項：

	
<p>箍筋綁紮均為同一處，未按規定交錯綁紮。</p>	<p>繫筋綁紮部分未與主筋密接。</p>
	



標準圖說及優良施工照片。

1. 柱繫筋彎鉤應上、下、左、右 135 度及 90 度交互配置綁紮。
2. 柱第一只箍筋綁紮位置應由結構體樓板完成面 5 公分開始綁紮，應按四個方向循環，交錯循環綁紮。
3. 梁柱接頭相關箍筋、繫筋應確實綁紮，梁主筋應於柱筋內。
4. T 字梁相交，主梁箍筋連續綁紮，梁底主筋與箍筋逐步綁紮。
