

臺中市議會第3屆第2次定期會
運動局、社會局、消防局、水利局、
觀旅局執行前瞻基礎建設107年進度
及後續108年執行進度

專案報告



報告人：

臺中市政府運動局：局長 李昱叡

臺中市政府社會局：局長 彭懷真

臺中市政府消防局：局長 曾進財

臺中市政府水利局：局長 范世億

臺中市政府觀光旅遊局：局長 林筱淇

中華民國108年10月17日

目錄

壹、運動局執行前瞻基礎建設進度專案報告	1
貳、社會局執行前瞻基礎建設進度專案報告	13
參、消防局執行前瞻基礎建設進度專案報告	27
肆、水利局執行前瞻基礎建設進度專案報告	30
伍、觀光旅遊局執行前瞻基礎建設進度專案報告	47

壹、運動局執行前瞻基礎建設進度專案報告

一、107 年辦理情形：中央核定共計 18 件，執行完成 11 件，執行中 6 件，待執行 1 件，依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第 8 條，中央對直轄市及縣（市）政府之計畫型補助款，應依財力級次給予不同補助比率，原則上按各直轄市及縣（市）政府財力分級表，本市財力分級為第二級，由教育部體育署補助本府總經費 60%，由本府自籌 40%，惟仍依各案性質予以適度調整。107 年度總計核定金額新臺幣 10 億 7,680 萬 5,541 元（中央核定共計新臺幣 6 億 3,228 萬元；本府自籌款共計新臺幣 4 億 4,452 萬 5,541 元；中央補助比例為 59%），各案辦理情形臚列如下：

（一）臺中市大雅體育園區第二期工程

1. 案件基本執行資料：

- （1）中央主政機關：教育部體育署。
- （2）中央補助計畫名稱：臺中市大雅體育園區第二期工程。
- （3）核准日期及文號：107 年 5 月 1 日臺教體署設（一）字第 1070015044 號函。
- （4）經費：中央核定補助款新臺幣 2,500 萬元、本府自籌款新臺幣 2,500 萬元、總計新臺幣 5,000 萬元。
- （5）中央補助比例：50%。

2. 辦理情形：

- （1）本案業於 108 年 4 月 18 日上網公告，於 108 年 5 月 27 日決標，於 108 年 6 月 18 日開工，108 年 7 月 4 日辦理開工動土典禮；因應地方民意需求辦理變更設計作業。
- （2）本案之變更設計計畫已於 108 年 9 月 6 日送體育署核備；體育署於 108 年 9 月 19 日函復原核定設置原住民傳統射箭場，係為保障原住民族平等運動權利並推廣傳統原住民族體育活動，若經考量無此需求刪除是項工作，

惟原核定該工項補助經費將予以扣減；本局目前刻正辦理重新修正對照表之增減項目，俟修正且核定後再續行函報體育署同意變更。

(二)臺中市國際壘球運動園區

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市國際壘球運動園區。
- (3)中央核准日期及文號:107 年 8 月 14 日臺教體署設(一)字第 1070028991 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 1 億 2,000 萬元、本府自籌款新臺幣 8,000 萬元、總計新臺幣 2 億元。
- (5)中央補助比例:60%。

2. 辦理情形：

- (1)本案已完成土地撥用、水土保持計畫、興辦事業計畫書等作業，於 108 年 7 月 8 日上網公告，已於 108 年 8 月 7 日開標，108 年 8 月 28 日公告決標。
- (2)預計 108 年 9 月底前建築師提送基本設計書圖報建設局審辦，經審查後續送體育署轉公共工程委員會審定。

(三)臺中市太平區槌球場第二期工程

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市太平區槌球場第二期工程。
- (3)核准日期及文號:107 年 4 月 25 日臺教體署設(一)字第 1070011313 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 180 萬元、本府自籌款新臺幣 120 萬元、總計新臺幣 300 萬元。
- (5)中央補助比例:60%。

2. 辦理情形：本案已於 108 年 4 月 25 日竣工，108 年 4 月 29

日竣工確認，108 年 5 月 8 日完成驗收作業，於 108 年 9 月 11 日向體育署完成核結作業。

(四)臺中市太平區河堤網球場地坪及夜間照明改善計畫

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市太平區河堤網球場地坪及夜間照明改善計畫。
- (3)中央核准日期及文號：107 年 5 月 10 日臺教體署設(一)字第 1070015118 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 175 萬元、本府自籌款新臺幣 265 萬元、總計新臺幣 440 萬元。
- (5)中央補助比例:40%。

2. 辦理情形：

- (1)本案於 108 年 1 月 18 日開工，於 108 年 4 月 9 日竣工，108 年 4 月 25 日完成工程驗收，108 年 7 月 5 日簽奉核可同意撥付工程尾款，並完成勞務驗收作業。
- (2)本案刻正撥付勞務尾款，並預計 108 年 10 月底前向體育署完成核結作業。

(五)臺中市沙鹿區網球場地坪及夜間照明改善計畫

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市沙鹿區網球場地坪及夜間照明改善計畫。
- (3)中央核准日期及文號：107 年 4 月 25 日臺教體署設(一)字第 1070011313A 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 150 萬元、本府自籌款新臺幣 1,01 萬元、總計新臺幣 251 萬元。
- (5)中央補助比例:60%。

2. 辦理情形：本案於 108 年 1 月 12 日開工，108 年 3 月 8 日竣工，108 年 3 月 25 日完成工程驗收，108 年 4 月 10 日撥付工程尾款，108 年 6 月 20 日完成勞務驗收，已於 8 月 14 日函文至體育署辦理核結作業。

(六) 臺中市南區健康公園溜冰場照明設備新設及汰換

1. 案件基本執行資料：

- (1) 中央主政機關：教育部體育署。
- (2) 中央補助計畫名稱：臺中市南區健康公園溜冰場照明設備新設及汰換。
- (3) 中央核准日期及文號：107 年 5 月 16 日臺教體署設(一)字第 1070017254A 號函。
- (4) 經費：中央核定補助款新臺幣 48 萬元、本府自籌款新臺幣 238 萬 4,000 元、總計新臺幣 286 萬 4,000 元。
- (5) 中央補助比例：17%。

2. 辦理情形：本案工程已於 108 年 5 月 3 日竣工，於 108 年 5 月 30 日完成工程驗收，預計 108 年 9 月 30 日啟動勞務驗收，並預計 108 年 10 月底前向體育署完成核結作業。

(七) 臺中市烏日區網球場地坪及夜間照明改善計畫

1. 案件基本執行資料：

- (1) 中央主政機關：教育部體育署。
- (2) 中央補助計畫名稱：臺中市烏日區網球場地坪及夜間照明改善計畫。
- (3) 中央核准日期及文號：107 年 5 月 16 日臺教體署設(一)字第 1070017254B 號函。
- (4) 經費：中央核定補助款新臺幣 92 萬元、本府自籌款新臺幣 62 萬元、總計新臺幣 154 萬元。
- (5) 補助比例：60%。

2. 辦理情形：本案已於 108 年 6 月 1 日竣工，108 年 6 月 11

日辦理竣工確認，108 年 8 月 1 日辦理工程驗收作業，目前刻正辦理勞務驗收作業，並預計 108 年 11 月中旬前向體育署完成核結作業。

(八)臺中市梧棲區運動場跑道整修計畫

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市梧棲區運動場跑道整修計畫。
- (3)中央核准日期及文號：107 年 4 月 25 日臺教體署設(一)字第 1070011313B 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 660 萬元、本府自籌款新臺幣 1,183 萬元、總計新臺幣 1,843 萬元。
- (5)補助比例:36%。

2. 辦理情形：本案於 108 年 2 月 15 日開工，於 108 年 4 月 25 日竣工，於 108 年 5 月 13 日辦理工程驗收完竣，108 年 6 月 27 日簽奉鈞長核可撥付工程尾款，108 年 7 月 30 日完成勞務驗收作業，已於 108 年 9 月 23 日向體育署辦理核結作業。

(九)臺中市清水區運動公園網球場地坪改善工程

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市清水區運動公園網球場地坪改善工程。
- (3)中央核准日期及文號：107 年 5 月 10 日臺教體署設(一)字第 1070015118A 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 193 萬元、本府自籌款新臺幣 129 萬元、總計新臺幣 322 萬元。
- (5)中央補助比例:60%。

2. 辦理情形：

(1)本工程於 108 年 2 月 14 日申報開工，惟迄今已逾預定完工日 100 日曆天以上，且依已核定之施工計畫書預定進度表及設計監造單位數次來文通知本局現場進度嚴重落後，並分別於 108 年 4 月 2 日、同年 5 月 2 日及同年 5 月 21 日召開趕工會議。另本局於施工期間經設計監造單位多次至現場巡查及親自至現場督導結果，分別於 4 月 9 日、4 月 24 日、6 月 5 日函請施工單位限期改善進度嚴重落後及現場缺失改善等事宜，惟經監造單位於 8 月 9 日來函說明尚有部分缺失未改善完全，且皆未見施工單位有積極之作為。

(2)本局於 108 年 8 月 26 日召開本案工程契約終止或續行會議，並於 108 年 9 月 23 日通知施工廠商本案契約終止，後續將重新辦理工程上網招標。

(十)臺中市太平體育場看台空間及盥洗室改善計畫

1. 案件基本執行資料：

(1)中央主政機關：教育部體育署。

(2)中央補助計畫名稱：臺中市太平體育場看台空間及盥洗室改善計畫。

(3)中央核准日期及文號：107 年 4 月 25 日臺教體署設(一)字第 1070011313C 號函。

(4)經費：中央核定補助款新臺幣 77 萬元、本府自籌款新臺幣 146 萬元、總計新臺幣 223 萬元。

(5)中央補助比例:35%。

2. 辦理情形：本案於 108 年 1 月 8 日開工，108 年 5 月 3 日工程竣工，108 年 5 月 22 日辦理工程驗收，108 年 9 月 10 日完成勞務驗收，並預計 108 年 10 月底前向體育署完成核結作業。

(十一)霧峰綜合運動場無障礙坡道設施計畫

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：霧峰綜合運動場無障礙坡道設施計畫
- (3)中央核准日期及文號：107 年 5 月 16 日臺教體署設(一)字第 1070017254 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 83 萬元、本府自籌款新臺幣 57 萬元、總計新臺幣 140 萬元。
- (5)中央補助比例:60%。

2. 辦理情形：本案於 107 年 5 月 23 日開工，107 年 8 月 17 日工程竣工，107 年 8 月 31 日完成工程驗收，107 年 9 月 21 日完成勞務驗收，並於 107 年 10 月 8 日向體育署完成核結作業。

(十二)大里區草湖溪健民及美群段高灘地興設簡易棒球場計畫

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：大里區草湖溪健民及美群段高灘地興設簡易棒球場計畫。
- (3)中央核准日期及文號：107 年 5 月 10 日臺教體署設(一)字第 1070015118D 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 240 萬元、本府自籌款新臺幣 160 萬元、總計新臺幣 400 萬元。
- (5)中央補助比例:60%

2. 辦理情形：本案於 107 年 12 月 7 日決標，於 108 年 1 月 4 日開工，108 年 5 月 20 日竣工，108 年 5 月 29 日竣工確認，108 年 6 月 20 日工程驗收完竣，108 年 9 月 6 日完成勞務驗收，並預計 108 年 10 月底前向體育署完成核結作業。

(十三)臺中市清水區三民路橋下籃球場整建工程

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市清水區三民路橋下籃球場整建工程。
- (3)中央核准日期及文號：107 年 4 月 25 日臺教體署設(一)字第 1070011313D 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 402 萬元、本府自籌款新臺幣 318 萬元、總計新臺幣 720 萬元。
- (5)中央補助比例:56%。

2. 辦理情形：本案於 107 年 12 月 18 日開工，108 年 3 月 15 日工程竣工，108 年 4 月 15 日完成工程驗收，108 年 6 月 19 日完成勞務驗收，並於 108 年 7 月 15 日向體育署完成核結作業。

(十四)臺中市清水區國道 4 號高架橋下休閒運動場地新建工程

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市清水區國道 4 號高架橋下休閒運動場地新建工程。
- (3)中央核准日期及文號：107 年 4 月 25 日臺教體署設(一)字第 1070011313E 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 348 萬元、本府自籌款新臺幣 266 萬元、總計新臺幣 614 萬元。
- (5)中央補助比例:57%。

2. 辦理情形：本案於 107 年 10 月 22 日開工，108 年 12 月 20 日工程竣工，108 年 1 月 8 日辦理工程驗收，108 年 3 月 11 日完成勞務驗收，並 108 年 5 月 8 日向體育署完成核結作業。

(十五)臺中市足球運動休閒園區興建工程

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市足球運動休閒園區興建工程。
- (3)中央核准日期及文號：107 年 6 月 13 日臺教體署設(一)字第 1070020292 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 4 億 4,940 萬元、本府自籌款新臺幣 3 億 125 萬 4,000 元、總計新臺幣 7 億 5,065 萬 4,000 元。
- (5)中央補助比例:60%。

2. 辦理情形：教育部於 109 年 7 月 23 日函文至本府，將逕行註銷本案補助，並按「教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點」第 11 點規定，得暫停受理本府 109 年度運動設施興整建申請計畫。本府於 108 年 8 月 8 日函復教育部，以原案爭取補助。教育部體育署於 108 年 8 月 15 日函復本案如有異地興建需求，仍請於確認用地權屬無虞下，俟該署開放受理申請案件時再行提案，並分別以府授運設字第 1080189252 號及府授運設字第 1080227869 號持續向中央積極爭取補助。

(十六)臺中市大甲區室外槌球場地新建工程計畫

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市大甲區室外槌球場地新建工程計畫。
- (3)中央核准日期及文號:107 年 12 月 7 日臺教體署設(一)字第 1070042565 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 120 萬元、本府自籌款新臺幣 86 萬 4,000 元、總計新臺幣 206 萬 4,000 元。

(5)中央補助比例:58%。

2. 辦理情形：本案於 108 年 3 月 20 日辦理開標及評選，108 年 3 月 28 日決標，108 年 4 月 10 日簽約，於 108 年 5 月 28 日核定預算書圖，108 年 6 月 5 日第一次上網招標，於 108 年 6 月 19 日流標(減價未低於底價)，於 108 年 7 月 2 日決標，於 108 年 7 月 19 日開工，108 年 9 月 26 日工程竣工，預計 108 年 10 月中旬前竣工確認。

(十七) 吉峰運動場設置多功能運動草皮工程

1. 案件基本執行資料：

(1)中央主政機關：教育部體育署。

(2)中央補助計畫名稱：吉峰運動場設置多功能運動草皮工程。

(3)中央核准日期及文號：107 年 11 月 5 日臺教體署設(一)字第 1070038529 號函。

(4)經費：中央核定補助款新臺幣 250 萬元、本府自籌款新臺幣 360 萬元、總計新臺幣 610 萬元。

(5)中央補助比例:41%。

2. 辦理情形：

(1)本案於 108 年 4 月 9 日委設決標；108 年 5 月 17 日核定預算書圖，於 108 年 6 月 18 日工程上網，108 年 6 月 28 日開標，並於 108 年 7 月 4 日決標，108 年 7 月 25 日開工。

(2)截至 108 年 09 月 26 日止，目前工程預定進度 32.88%，實際進度 35.32%，預計 108 年 10 月 23 日工程竣工。

(十八) 改善臺中市豐原區軟埤仔溪水域運動環境運動設施興建計畫

1. 案件基本執行資料：

(1)中央主政機關：體育署。

- (2)中央補助計畫名稱：營造休閒運動環境。
- (3)中央核准日期及文號:107 年 11 月 13 日臺教體署設(三)字第 1070039785 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 660 萬元、本府自籌款新臺幣 445 萬 3,541 元、總計新臺幣 1 仟 105 萬 3,541 元。
- (5)中央補助比例:60%。

2. 辦理情形：

- (1)108 年 5 月 27 日辦理現場會勘。
- (2)108 年 9 月 12 日採購簽呈奉准。
- (3)108 年 9 月 19 日上網公告。
- (4)預計開標日期:108 年 10 月 21 日。

二、108 年辦理情形：中央核定共計 3 件，均執行中，依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第 8 條，中央對直轄市及縣（市）政府之計畫型補助款，應依財力級次給予不同補助比率，原則上按各直轄市及縣（市）政府財力分級表，本市財力分級為第二級，由教育部體育署補助本府總經費 60%，由本府自籌 40%，惟仍依各案性質予以適度調整。108 年度總計核定金額新臺幣 8,440 萬元（中央核定共計新臺幣 4,968 萬元；本府自籌款共計新臺幣 3,472 萬元；中央補助比例為 59%），辦理情形臚列如下：

（一）臺中市大里區大仁段 542 地號足球場興建工程

1. 案件基本執行資料：

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：臺中市大里區大仁段 542 地號足球場興建工程。
- (3)中央核准日期及文號： 108 年 4 月 1 日臺教體署設(一)字第 1080009823 號函。
- (4)經費：中央核定補助款新臺幣 660 萬元、本府自籌款新

臺幣 440 萬元、總計新臺幣 1,100 萬元。

(5)中央補助比例:60%。

2. 辦理情形：本案委託規劃設計已於 108 年 9 月 11 日公告決標，目前刻正辦理簽約用印事宜，預計 109 年中旬前工程竣工。

(二) 臺中市自由車場賽道照明工程整修計畫

1. 案件基本執行資料：

(1)中央主政機關：教育部體育署。

(2)中央補助計畫名稱：臺中市自由車場賽道照明工程整修計畫。

(3)中央核准日期及文號：108 年 5 月 8 日臺教體署設(一)字第 1080013775 號函。

(4)經費：中央核定補助款新臺幣 1,308 萬元、本府自籌款新臺幣 1,032 萬元、總計新臺幣 2,340 萬元。

(5)中央補助比例:56%。

2. 辦理情形：本案刻正擬具勞務上網發包等相關文件。

(三) 改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫

1. 案件基本執行資料：

(1)中央主政機關：教育部體育署。

(2)中央補助計畫名稱：改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫。

(3)中央核准日期及文號:108 年 6 月 25 日臺教體署設(二)字第 1080021894 號函。

(4)經費：中央核定補助款新臺幣 3,000 萬元、本府自籌款新臺幣 2,000 萬元、總計新臺幣 5,000 萬元。

(5)中央補助比例:60%。

2. 辦理情形：本案已於 108 年 9 月 18 日上網公告，預計 108 年 10 月 1 日開標；另本案刻正依預算墊付程序辦理並業已提送議會審議。

貳、社會局執行前瞻基礎建設進度專案報告

一、107 年辦理情形：中央核定共計 23 件，執行完成 16 件，辦理情形臚列如下：

(一) 臺中市身心障礙綜合福利服務中心整備修繕工程(佈建長照)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 158 萬 6,000 元、本府自籌款新臺幣 39 萬 6,500 元、總計新臺幣 198 萬 2,500 元。

2. 辦理情形：

(1) 工程已於 108 年 9 月竣工結算。

(2) 本案甄選由「財團法人大心福利服務共創協會」申請設立長照據點，並已於 108 年 9 月 5 日成立「社區照顧關懷據點」設置 C 級巷弄長照站。

(二) 臺中市 107 年度海線社區照顧服務中心修繕計畫

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 432 萬元、本府自籌款新臺幣 333 萬元、總計新臺幣 765 萬元。

2. 辦理情形：已於 108 年 7 月竣工，結算作業中。

(三) 大甲區孟春社區暨聯合服務中心增建工程(107-109 年)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 1,564 萬 3,000 元、本府自籌款新臺幣 854 萬 4,300 元、總計新臺幣 2,418 萬 7,300 元。

2. 辦理情形：

(1)本案由大甲區公所執行。

(2)已完成多目標審查、都市審議，目前依都市審議意見修正圖說申請建照中，預計 108 年 10 月工程招標。

(四) 大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建案(107-108 年)

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 2,000 萬元、本府自籌款新臺幣 788 萬 2,600 元、總計新臺幣 2,788 萬 2,600 元。

2. 辦理情形：

(1)本案由大甲區公所執行。

(2)已於 108 年 3 月開工，目前施工中。

(五) 大里區竹仔坑社區活動中心修繕案

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 240 萬元、本府自籌款新臺幣 60 萬元、總計新臺幣 300 萬元。

2. 辦理情形：

(1)本案由大里區公所執行。

(2)已結案，長照服務導入中。

(六) 沙鹿區斗抵社區活動中心修繕案

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 240 萬元、本府自籌款新臺幣 60 萬元、總計新臺幣 300 萬元。

2. 辦理情形：

(1)本案由沙鹿區公所執行。

(2)已結案，長照服務導入中。

(七) 沙鹿區犁分社區活動中心新建案（107-108 年）

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 991 萬 8,000 元、本府自籌款新臺幣 481 萬 6,070 元、總計新臺幣 1,473 萬 4,070 元。

2. 辦理情形：

(1)本案由沙鹿區公所執行。

(2)變更設計中，預計 108 年 10 月 31 日開工。

(八) 和平區雙崎社區活動中心修繕案

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 321 萬 2,000 元、本府自

籌款新臺幣 80 萬 4,000 元、總計新臺幣 401 萬 6000 元。

2. 辦理情形：

(1) 本案由和平區公所執行。

(2) 已於 108 年 5 月開工，目前施工中。

(九) 東區家庭福利服務中心修繕工程

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 185 萬元、本府自籌款新臺幣 130 萬元、總計新臺幣 315 萬元。

2. 辦理情形：已於 108 年 3 月竣工並完成結算。

(十) 大里區家庭福利服務中心修繕工程

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 185 萬元、本府自籌款新臺幣 50 萬元、總計新臺幣 235 萬元。

2. 辦理情形：本案已於 108 年 7 月開工，目前施工中。

(十一) 北屯區家庭福利服務中心修繕及充實設施設備

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 105 萬元、本府自籌款新臺幣 30 萬元、總計新臺幣 135 萬元。

2. 辦理情形：已於 108 年 8 月結案。

(十二) 西區家庭福利服務中心修繕及充實設施設備

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 15 萬元、本府自籌款新臺幣 5 萬元、總計新臺幣 20 萬元。

2. 辦理情形：已於 108 年 4 月結案。

(十三) 南屯區家庭福利服務中心修繕工程

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 45 萬元、本府自籌款新臺幣 15 萬元、總計新臺幣 60 萬元。

2. 辦理情形：已於 108 年 8 月結案。

(十四) 大甲區家庭福利服務中心修繕及充實設施設備

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 100 萬元、本府自籌款新臺幣 342 萬元、總計新臺幣 442 萬元。

2. 辦理情形：已於 108 年 7 月竣工，結算作業中。

(十五) 東區家庭福利服務中心（電腦軟硬體採購）

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-

2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 15 萬元、本府自籌款新臺幣 5 萬 5,937 元、總計新臺幣 20 萬 5,937 元。

2. 辦理情形：已於 108 年 5 月驗收結算。

(十六)大里區家庭福利服務中心（電腦軟硬體採購）

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 15 萬元、本府自籌款新臺幣 5 萬 5,937 元、總計新臺幣 20 萬 5,937 元。

2. 辦理情形：已於 108 年 5 月驗收結算。

(十七)南屯區家庭福利服務中心（電腦軟硬體採購）

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 54 萬元、本府自籌款新臺幣 19 萬 8,323 元、總計新臺幣 73 萬 8,323 元。

2. 辦理情形：已於 108 年 5 月驗收結算。

(十八)大甲區家庭福利服務中心（電腦軟硬體採購）

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 54 萬元、本府自籌款新臺幣 19 萬 8,323 元、總計新臺幣 73 萬 8,323 元。

2. 辦理情形：已於 108 年 5 月驗收結算。

(十九) 東勢婦女館修繕工程

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 500 萬元、本府自籌款新臺幣 125 萬元、總計新臺幣 625 萬元

2. 辦理情形：已於 108 年 6 月結案。

(二十) 東區社區公共托育家園 (107-108 年)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 315 萬元、本府自籌款新臺幣 175 萬元、總計新臺幣 490 萬元。

2. 辦理情形：已竣工結算，並於 108 年 6 月 10 日家園開辦。

(二十一) 北區社區公共托育家園 (107-108 年)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 315 萬元、本府自籌款新臺幣 175 萬元、總計新臺幣 490 萬元。

2. 辦理情形：已竣工結算，並於 108 年 7 月 26 日家園開辦。

(二十二) 梧棲社區公共托育家園 (107-108 年)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-

2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 240 萬元、本府自籌款新臺幣 146 萬元、總計新臺幣 386 萬元。

2. 辦理情形：已竣工結算，並於 108 年 8 月 16 日家園開辦。

(二十三) 石岡托育資源中心整修工程

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 250 萬元、本府自籌款新臺幣 69 萬元、總計新臺幣 319 萬元。

2. 辦理情形：已於 108 年 7 月竣工，結算作業中。

二、108 年辦理情形：中央核定共計 19 件，執行完成 2 件，辦理情形臚列如下：

(一) 臺中市 108 年度海線社區照顧服務中心修繕計畫

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫。

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 964 萬 8,000 元、本府自籌款新臺幣 241 萬 2,000 元、總計新臺幣 1,206 萬元。

2. 辦理情形：已於 108 年 8 月委設決標，目前辦理規劃設計作業，預計 108 年 11 月工程招標。

(二) 臺中市立仁愛之家興建多功能大樓

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：衛生福利部。

(2)中央補助計畫名稱：公共服務據點整備－整建長照衛福據

點計畫。

- (3)經費：中央核定補助款新臺幣 8,100 萬元、本府自籌款新臺幣 3 億 7,910 萬 5,000 元、總計新臺幣 4 億 6,010 萬 5,000 元。

2. 辦理情形：

- (1)本案委託建設局代辦。
- (2)本案已完成工程規劃報告及基本設計，並於 7 月 26 日及 8 月 26 日自辦都市設計審議委員會，目前積極修正都審報告書，俟修正完成接續辦理本市都市設計審議委員會備查作業，預計 109 年 3 月工程決標。

(三) 西區家庭福利服務中心（充實設施設備）

1. 案件基本執行資料

- (1)中央主政機關：衛生福利部。
- (2)中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設—建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。
- (3)經費：中央核定補助款新臺幣 28 萬 8,000 元、本府自籌款新臺幣 7 萬 2,000 元、總計新臺幣 36 萬元。

2. 辦理情形：108 年 7 月 3 日議會同意辦理先行墊付，目前積極辦理標案採購中。

(四) 大雅區家庭福利服務中心（充實設施設備）

1. 案件基本執行資料

- (1)中央主政機關：衛生福利部。
- (2)中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設—建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。
- (3)經費：中央核定補助款新臺幣 43 萬 2,000 元、本府自籌款新臺幣 10 萬 8,000 元、總計新臺幣 54 萬元。

2. 辦理情形：108 年 7 月 3 日議會同意辦理先行墊付，目前積極辦理標案採購中。

(五) 西屯區家庭福利服務中心（充實設施設備）

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 43 萬 2,000 元、本府自籌款新臺幣 10 萬 8,000 元、總計新臺幣 54 萬元。

2. 辦理情形：108 年 7 月 3 日議會同意辦理先行墊付，目前積極辦理標案採購中。

(六) 北區家庭福利服務中心（外展車）

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 80 萬元、本府自籌款新臺幣 20 萬元、總計新臺幣 100 萬元

2. 辦理情形：本案於 108 年 8 月 6 日獲得中央核定補助，目前辦理相關採購作業。

(七) 東區家庭福利服務中心無障礙整修工程及外展車

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 280 萬元、本府自籌款新臺幣 70 萬元、總計新臺幣 350 萬元

2. 辦理情形：本案於 108 年 8 月 6 日獲得中央核定補助，因經本局委託外部工程專業多面向進行評估，現場不適合裝設外掛式電梯，已於 9 月 11 日向中央提送計畫變更，改以

施作電動輔具樓梯升降椅，目前待中央核定中。

(八) 烏日區綜合社會福利館

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 5,797 萬元、本府自籌款新臺幣 4,203 萬元、總計新臺幣 1 億元。

2. 辦理情形：

(1) 本案委託水利局代辦。

(2) 已於 108 年 9 月 25 日開工。

(九) 臺中市太平托育資源中心

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 350 萬元、本府自籌款新臺幣 525 萬元、總計新臺幣 875 萬元

2. 辦理情形：已於 108 年 9 月委設決標，目前辦理規劃設計作業，預計 108 年 12 月工程決標。

(十) 石岡托育資源中心

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 150 萬元、本府自籌款新臺幣 37 萬 5,000 元、總計新臺幣 187 萬 5,000 元

2. 辦理情形：已於 108 年 8 月決標，目前辦理營運籌備設施

設備採購，預計 108 年 12 月開幕。

(十一) 東勢區社區公共托育家園

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 180 萬元、本府自籌款新臺幣 381 萬 3,400 元、總計新臺幣 561 萬 3,400 元。

2. 辦理情形：已於 108 年 7 月委設決標，目前辦理規劃設計作業，預計 108 年 10 月工程招標。

(十二) 西屯區社區公共托育家園

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：少子化友善育兒空間建設－建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 180 萬元、本府自籌款新臺幣 262 萬 7,804 元、總計新臺幣 442 萬 7,804 元。

2. 辦理情形：108 年 8 月委設決標，目前辦理規劃設計作業，預計 108 年 11 月工程招標。

(十三) 清水區南社社區活動中心耐震能力評估

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備－公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 30 萬元、本府自籌款新臺幣 9 萬元、總計新臺幣 39 萬元。

2. 辦理情形：本案由清水區公所執行，已辦理完成。

(十四) 東勢區慶福社區活動中心耐震能力評估

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 14 萬元、本府自籌款新臺幣 6 萬元、總計新臺幣 20 萬元。

2. 辦理情形：本案由東勢區公所執行，已辦理完成。

(十五) 大里區東興社區活動中心耐震補強計畫

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 192 萬元、本府自籌款新臺幣 95 萬 6,179 元、總計新臺幣 287 萬 6,179 元。

2. 辦理情形：本案由大里區公所執行，因本棟建築物與幼兒園共用，俟教育局取得國教署補助後，併請公所盡速辦理招標作業。

(十六) 大里區樹王社區活動中心耐震補強計畫

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 200 萬元、本府自籌款新臺幣 118 萬 4,026 元、總計新臺幣 318 萬 4,026 元。

2. 辦理情形：本案由大里區公所執行，因本棟建築物與幼兒園共用，俟教育局取得國教署補助後，併請公所盡速辦理招標作業。

(十七) 清水區糠榔社區活動中心耐震能力評估

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 26 萬元、本府自籌款新臺幣 11 萬 1,477 元、總計新臺幣 37 萬 1,477 元。

2. 辦理情形：本案由清水區公所執行，目前辦理耐震評估作業，預計 108 年 11 月完成。

(十八) 臺中市外埔區老人文康中心耐震補強工程

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 634 萬元、本府自籌款新臺幣 271 萬 8,000 元、總計新臺幣 905 萬 8,000 元。

2. 辦理情形：本案由外埔區公所執行，工程於 108 年 7 月開工，目前施工中。

(十九) 大雅親子館及葫蘆墩親子館耐震補強計畫

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：衛生福利部。

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備-公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫。

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 969 萬 5,000 元、本府自籌款新臺幣 416 萬 6,522 元、總計新臺幣 1,386 萬 1,522 元。

2. 辦理情形：已於 108 年 8 月委設決標，目前辦理規劃設計作業，預計 108 年 11 月工程決標。

參、消防局執行前瞻基礎建設進度專案報告

一、 107 年辦理情形：中央核定共計 3 件，均執行中，辦理情形臚列如下：

(一) 本府計畫名稱：前瞻計畫消防機關廳舍補強重建(第七救災救護大隊暨中港分隊廳舍耐震補強改善及翻修工程)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：內政部消防署

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 9,754,000 元、本府自籌款新臺幣 23,000,000 元、總計新臺幣 32,754,000 元

2. 辦理情形：本案工程施工中，截至 108 年 9 月 22 日止，預定進度 92.28%，實際進度 93.66%，預定 108 年 11 月底前竣工。

(二) 本府計畫名稱：前瞻計畫消防機關廳舍補強重建(第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：內政部消防署

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備

(3) 經費：

105 年度市庫 3,220,000 元

106 年度市庫 20,000,000 元

107 年度中央核定補助款 18,746,000 元、本府自籌款新臺幣 26,780,000 元，(105-107 年總計新臺幣 68,746,000 元)

2. 辦理情形：目前工程施作中，截至 108 年 9 月 25 日止預定進度 48.8%，實際進度 49.3%，預計 109 年 1 月完工。

(三) 本府計畫名稱：前瞻計畫消防機關廳舍補強重建(第三救災救護大隊太平分隊廳舍拆除重建工程)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：內政部消防署

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 9,436,000 元、本府自籌款新臺幣 4,044,000 元、107 年度總計新臺幣 13,480,000 元(107 及 109 計畫總經費 48,833,000 元)

2. 辦理情形：工程招標文件製作中，預計 108 年 10 月上網公告，110 年 5 月工程完工。

二、 108 年辦理情形：中央核定共計 3 件，均執行中，辦理情形臚列如下：

(一) 本府計畫名稱：前瞻計畫消防機關廳舍補強重建(神岡分隊消防廳舍耐震補強改善工程)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：內政部消防署

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 700,000 元、本府自籌款新臺幣 300,000 元、總計新臺幣 1,000,000 元

2. 辦理情形：本案工程發包已於 108 年 9 月 25 日決標，預定 108 年 10 月中旬開工，109 年 3 月竣工。

(二) 本府計畫名稱：前瞻計畫消防機關廳舍補強重建(烏日分隊消防廳舍耐震補強改善工程)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：內政部消防署

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 2,450,000 元、本府自籌款新臺幣 1,050,000 元、總計新臺幣 3,500,000 元

2. 辦理情形：本案工程發包已於 108 年 9 月 25 日決標，預定

108 年 10 月中旬開工，109 年 3 月竣工。

(三) 本府計畫名稱：前瞻計畫消防機關廳舍補強重建(信義分隊
消防廳舍耐震補強改善工程)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：內政部消防署

(2) 中央補助計畫名稱：公共服務據點整備

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 5,118,000 元、本府自籌
款新臺幣 2,194,000 元、總計新臺幣 7,312,000 元

2. 辦理情形：本案工程發包已於 108 年 9 月 25 日決標，預定
108 年 10 月中旬開工，109 年 3 月竣工。

肆、水利局執行前瞻基礎建設進度專案報告

【水環境建設－水與安全】

一、107 年辦理情形：中央核定共計 32 件，執行完成 13 件，辦理情形臚列如下：

（一）臺中市防洪綜合治理工程

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：經濟部水利署

(2) 中央補助計畫名稱：縣市管河川及區域排水整體改善計畫

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 2 億 5,676 萬 3,000 元、本府自籌款新臺幣 510 萬元、總計新臺幣 2 億 6,186 萬 3,000 元。

2. 辦理情形：(共計 6 件，執行情形如下表)

本計畫共核定 6 件，分 4 條水系整治(山腳排水、旱溪上游北坑、中興段排水及車籠埤排水等)，目前已完工 2 件，其餘 4 件施工中。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	實支率 (%)
1	霧峰區車籠埤排水 1K+700~3K+700 治理工程	7,900	36%	36%	11%
2	霧峰區車籠埤排水 3K+700~5K+300 治理工程	7,500	35%	35%	10%
3	霧峰區車籠埤排水 1K+700~3K+700 治理工程－2K+000 四德九鄰橋、3K+718 北阡二橋、3K+837 無名橋改建工程	1,700	100%	100%	100%
4	大里區中興段排水治理工程	2,600	100%	100%	30%
5	臺中市豐原區旱溪上游北坑 0K+000~0K+741.4 治理工程	1,086	100%	100%	0% (廠商尚未請款)

6	龍井區山腳排水 (4K+225~4K+330)治理工程	5,400	26%	26%	0% (廠商尚未請款)
---	--------------------------------	-------	-----	-----	----------------

(二) 臺中市雨水下水道及其他排水改善工程

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：內政部營建署

(2) 中央補助計畫名稱：縣市管河川及區域排水整體改善計畫

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 4 億 8,082 萬元、本府自籌款新臺幣 1 億 4,726 萬元、總計新臺幣 6 億 2,808 萬元。

2. 辦理情形：(共計 24 件，執行情形如下表)

(1) 雨水下水道系統檢討規劃：辦理清水區、龍井區、沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃，共計 3 件，總經費 3,600 萬元，預計 109 年底規劃完成。

(2) 雨水下水道普查：辦理臺中市原八區及豐原、霧峰、太平、大甲、東勢、臺中港特定區等地區雨水下水道普查案，共計 3 件，總經費 9,208 萬元，其中 2 件已完成，1 件普查中。

(3) 雨水下水道工程：包含太平區鵬儀路雨水下水道延續工程等共計 12 件，總經費 2 億元，其中 7 件完工，5 件施工中。

(4) 其他排水改善工程：包含大里區草湖公園、新社區協成里九渠溝興中街分流工程等共計 6 件，總經費 3 億元，其中 2 件完工，4 件施工中。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	實支率 (%)
1	臺中市東勢區石城街排水工程	1,200	100%	100%	93%

2	臺中市大里區大峰路防災公園(工程費)	14,000	9%	9%	6%
3	臺中市清水區高美路排水工程	2,400	23%	23%	1%
4	臺中市沙鹿區(M13)上游雨水下水道工程	554	100%	100%	75%
5	臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第五期)	3,100	11%	11%	11%
6	臺中市清水區公正路雨水下水道工程	5,400	72%	72%	72%
7	臺中市太平區鵬儀路雨水下水道延續工程	940	75%	75%	2%
8	臺中市太平區中和街雨水下水道工程	1,000	68%	68%	43%
9	臺中市沙鹿區過洋路與平等一街雨水下水道工程	450	100%	100%	80%
10	西屯區黎明路雨水下水道整建工程	4,300	95%	97%	0% (廠商尚未請款)
11	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程(第一標)	1,700	100%	100%	53%
12	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程(第二標)	10,300	13%	13%	9%
13	新社區東興里東興地區排水工程	2,000	43%	43%	20%
14	新社區復盛里慈光新村滯洪池工程	1,400	57%	57%	29%
15	大里區西湖路排水改善工程	760	100%	100%	53%
16	霧峰區錦州路395巷排水改善工程	600	100%	100%	79%
17	南屯區中和排水閘門整建工程	450	100%	100%	70%

18	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃	1,600	20%	20%	19%
19	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃	1,040	20%	20%	19%
20	臺中市清水區雨水下水道系統檢討規劃	960	20%	20%	19%
21	台中港特定區雨水下水道系統檢討規劃縱走普查委託技術服務	1,700	50%	50%	50%
22	臺中市豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案	2,835	20%	20%	14%
23	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案	4,665	20%	20%	14%
24	臺中市沙鹿區中山路永安巷淹水改善工程	1,096	25%	25%	16%

(三) 軟埤仔溪排水系統及七星排水治理計畫

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：經濟部水利署

(2) 中央補助計畫名稱：縣市管河川及區域排水整體改善計畫

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 182 萬元、本府自籌款新臺幣 78 萬元、總計新臺幣 260 萬元

2. 辦理情形：(共計 2 件，執行情形如下表)

本計畫共核定 2 件，辦理「軟埤仔溪排水、陽明山排水、下溪洲支線、下溪洲分線等治理計畫」及「七星排水治理計畫」等 2 案，以改善神岡區軟埤仔溪排水下游段及太平區七星排水通洪能力不足問題，目前已完成期中報告階段，預計 108 年 12 月底前將工作成果送交經濟部水利署審議。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	實支率 (%)
1	臺中市管區域排水七星排水治理計畫委託技術服務	110	20%	20%	19%
2	臺中市管區域排水軟埤仔溪排水、陽明山排水、下溪洲支線、下溪洲分線等治理計畫委託技術服務	150	20%	20%	20%

二、108 年辦理情形：中央核定共計 10 件，執行完成 1 件，辦理情形臚列如下：

(一) 108 年度應急工程工作計畫

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：經濟部水利署

(2) 中央補助計畫名稱：縣市管河川及區域排水整體改善計畫

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 1,330 萬元、本府自籌款新臺幣 570 萬元、總計新臺幣 1,900 萬元

2. 辦理情形：(共計 2 件，執行情形如下表)

本計畫共核定 2 件，分 2 條水系整治(十三寮排水、沙連溪排水)，目前已完工 1 件，其餘 1 件施工中。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	實支率 (%)
1	大雅區十三寮排水雅秀一橋下游溝渠左岸土堤改建應急工程	1,000	70%	70%	0% (廠商尚未請款)
2	東勢區沙連溪新崙橋下游左側護岸改善應急工程	900	59%	59%	43%

(二) 臺中市雨水下水道及其他排水改善工程

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：內政部營建署

(2)中央補助計畫名稱：縣市管河川及區域排水整體改善計畫

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 2 億 7,182 萬元、本府自籌款新臺幣 4,150 萬元、總計新臺幣 3 億 1,332 萬元。

2. 辦理情形：(共計 6 件，執行情形如下表)

(1)雨水下水道工程：包含梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程等共計 4 件，總經費 1 億 7,500 萬元，目前設計中，預計 108 年底發包。

(2)其他排水改善工程：包含臺中市外埔區八支線大馬路排水工程等共計 2 件，總經費 1 億 3,832 萬元，目前設計中，預計 108 年底發包。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	核定日期	設計完成 日期	上網日期	決標日期	備註
1	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道改善工程	13,200	108/5/16	-	-	-	設計中
2	臺中市大甲區民權路雨水下水道改善工程	2,000	108/5/16	108/7/10	108/8/7	108/9/16	
3	臺中市潭子區仁愛路二段雨水下水道工程	1,000	108/5/16	108/7/24	108/8/9	108/9/12	
4	臺中市烏日區學田路雨水下水道新建工程	2,500	108/5/16	-	-	-	設計中
5	臺中市新社區永源里東山街排水工程	3,600	108/5/16	-	-	-	設計中
6	臺中市外埔區八支線大馬路排水工程	10,232	108/5/16	-	-	-	設計中

(三) 南屯溪排水及光興隆排水治理規劃檢討

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：經濟部水利署

(2)中央補助計畫名稱：縣市管河川及區域排水整體改善計畫

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 343 萬元、本府自籌款新臺幣 147 萬元、總計新臺幣 490 萬元

2. 辦理情形：(共計 2 件，執行情形如下表)

本計畫共核定 2 件，辦理「南屯溪排水治理規劃檢討」及「光隆村興隆村共同排水系統規劃檢討」等 2 案，以改善南屯溪及太平光興隆地區淹水問題，提升市管區域排水設計保護標準，保障市民生命財產安全，目前辦理發包作業中。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	核定日期	上網日期	決標日期	備註
1	南屯溪排水治理規劃檢討	290	108/7/18	108/9/26	-	採購中
2	光隆村興隆村共同排水系統規劃檢討	200	108/7/18	108/8/30	-	採購中

【水環境建設－水與環境】

一、107 年辦理情形：中央核定共計 26 件，執行完成 7 件，辦理情形臚列如下：

（一）柳川第二期水環境改善計畫

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：行政院環境保護署

(2) 中央補助計畫名稱：全國水環境改善計畫

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 8 億 5,390 萬 9,000 元、
本府自籌款新臺幣 3 億 6,596 萬 1,000 元、總計新臺幣
12 億 1,987 萬元

2. 辦理情形：（共計 5 件，執行情形如下表）

(1) 計畫概述：主要內容包含柳川截流改善、防洪箱涵施作、
低衝擊開發措施、河道拓寬及打造兩岸綠帶緩坡增加綠
地空間，另辦理中華水淨場功能改善、中正水淨場興建、
北新國中通學平台及五權國中人行便橋等。

(2) 計畫期程：共分 3 年執行(107~109 年)。

(3) 執行情形：核定 5 件計畫，目前中華水淨場功能改善已
完工，其餘各計畫正常施工中。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	實支率 (%)
1	柳川中華水質淨化場功能改善計畫	2,300	100%	100%	100%
2	柳川污染整治及環境改善計畫 (林森柳橋至民權柳橋)	41,650	40%	44%	27%
3	柳川污染整治及環境改善計畫 (三民柳橋至林森柳橋)	37,217	7%	14%	6%
4	柳川污染整治及環境改善計畫 (中正公園段至舊社公園截流工程及中正水淨場)	37,256	8%	10%	3%

5	柳川污染整治及環境改善工程 (第二期)植栽移植開口契約	3,564	26%	26%	26%
---	--------------------------------	-------	-----	-----	-----

(二) 綠川水環境改善計畫

1. 案件基本執行資料

- (1) 中央主政機關：內政部營建署、行政院環境保護署
- (2) 中央補助計畫名稱：全國水環境改善計畫
- (3) 經費：中央核定補助款新臺幣 9 億 7,507 萬 4,000 元、
本府自籌款新臺幣 3 億 9,803 萬 5,000 元、總計新臺幣
13 億 7,310 萬 9,000 元

2. 辦理情形：(共計 9 件，執行情形如下表)

- (1) 計畫概述：本計畫主要內容為防洪安全、水質改善、設備系統功能提升及景觀環境營造，範圍為綠川(民權路至大明路河段，長度約 6 公里)及下游福田水資中心及周邊系統。
- (2) 計畫期程：共分 3 年執行(107~109 年)。
- (3) 執行情形：核定 9 件計畫，目前復興路至愛國街河段工程、福田水資中心功能提升已完工，其餘各計畫刻正施工中。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	實支率(%)
1	臺中市綠川水環境改善計畫-污水截流及環境營造(復興路至愛國街)	4,721	100%	100%	100%
2	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)	16,000	27%	32%	29%
3	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	9,000	0%	1%	0% (未達請款條件)
4	臺中市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路周邊河岸綠帶節點串連)	35,000	5%	6%	6%

5	臺中市綠川水環境改善計畫(興大園道亮點河岸計畫)	35,000	2%	2%	2%
6	臺中市綠川水環境改善計畫(信義南街至大明路)污水截流及環境復原計畫	9,590	28%	30%	28%
7	臺中市綠川水質現地處理設施	25,000	11%	7%	0% (未達請款條件)
8	福田水資源回收中心(福田特高壓)	1,700	100%	100%	86%
9	福田水資源回收中心(管網系統功能提升)	1,300	46%	79%	4%

(三) 惠來溪系統(惠來溪、潮洋溪及黎明溝)水環境改善計畫

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：內政部營建署、行政院環境保護署

(2)中央補助計畫名稱：全國水環境改善計畫

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 4 億 7,208 萬元、本府自籌款新臺幣 2 億 232 萬元、總計新臺幣 6 億 7,440 萬元

2. 辦理情形：(共計 5 件，執行情形如下表)

(1)計畫概述：本計畫共分「黎明溝水環境改善計畫」、「惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程」、「惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程」、「黎明水資源回收中心環境再造」、「水湳經貿園區中水道系統應用及智慧管理操作維護」，主要內容針對惠來溪相關水系進行污水截流、水質改善、設備功能提升及環境景觀營造，範圍為惠來溪、潮洋溪、黎明溝及水湳經貿園區。

(2)計畫期程：共分 3 年執行(107~109 年)。

(3)執行情形：核定 5 件計畫，目前「黎明溝水環境改善計畫」及「黎明水資源回收中心環境再造」已完工，其餘 3 件刻正施工中。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	實支率(%)
1	黎明溝水環境改善計畫	3,500	100%	100%	25%
2	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	31,940	10%	12%	12%
3	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	27,100	9%	9%	9%
4	惠來溪水環境改善計畫-黎明水資源回收中心環境再造	800	100%	100%	72%
5	惠來溪水環境改善計畫-水湍經貿園區中水道系統應用及智慧管理操作維護	4,100	80%	80%	48%

(四) 旱溪排水水環境改善計畫

1. 案件基本執行資料

- (1)中央主政機關：內政部營建署、行政院環境保護署
- (2)中央補助計畫名稱：全國水環境改善計畫
- (3)經費：中央核定補助款新臺幣 1 億 6,466 萬元、本府自籌款新臺幣 5,514 萬元，總計新臺幣 2 億 1,980 萬元

2. 辦理情形：(共計 4 件，執行情形如下表)

- (1)計畫概述：本計畫除部分為旱溪周邊重劃區污水下水道功能提升，主要為南區康橋計畫上游及下游水環境營造延伸，範圍工程利用國光橋下游右岸設置處理量 5000CMD 之礫間處理設施，改善旱溪排水水質，另下游水利園區透過兩岸植栽重新整理及人行橋暨步道動線改善，可落實旱溪排水全流域整治計畫。
- (2)計畫期程：共分 3 年執行(107~109 年)。
- (3)執行情形：核定 4 件計畫，目前執行中，預計 109 年 12 月前全數完成。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	實支率 (%)
1	早溪排水水環境及鄰近區域 設施改善工程-水利園區	7,525	27%	30%	15%
2	早溪排水水環境及鄰近區域 設施改善工程-現地處理	8,455	20%	20%	8%
3	早溪排水相關重劃區污水下 水道系統設施功能提升工程 -新光重劃區	3,100	53%	80%	23%
4	早溪排水相關重劃區污水下 水道系統設施功能提升工程 -十期重劃區	2,900	43%	50%	35%

(五) 筏子溪水環境改善計畫

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：行政院環境保護署

(2) 中央補助計畫名稱：全國水環境改善計畫

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 9,724 萬元、地方自籌款新臺幣 6,096 萬元(本府：5,346 萬元、水利會：750 萬元)，總計新臺幣 1 億 5,820 萬元

2. 辦理情形：(共計 1 件，執行情形如下表)

(1) 計畫概述：為改善筏子溪水環境，由市府辦理改善工程，透過筏子溪支流林厝排水高污染當量污水截流，往下游輸送至林厝排水出口右岸礫間淨化場處理後放流回河道，以改善周邊生態環境及河川水質。此外也一併整理筏子溪車路巷橋至永安橋間之水防道路使成為複層植栽之生態綠廊，可供民眾散步觀水，亦可供生物棲息。而原水利會下埤圳 3m 高落差固床工往上游改建成 90 公分低落差攔水堰並增加低水流路及魚道更大大提升本河段生態連續性，相信經過本計畫生態復育之思維，不但可提供大眾近水、親綠的友善環境；而礫間設施亦可作為中小學環境教育場域。

(2)計畫期程：共分 3 年執行(107~109 年)。

(3)執行情形：核定 1 件計畫，目前施工中，預計於 109 年底前完工。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	實支率 (%)
1	筏子溪景觀環境營造工程 (車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	13,892	25%	21%	7%

(六) 山腳大排(南勢溪、南勢坑溪)水環境改善計畫

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：經濟部水利署

(2)中央補助計畫名稱：全國水環境改善計畫

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 4,921 萬 3,000 元、本府自籌款新臺幣 2,237 萬 7,000 元，總計新臺幣 7,459 萬元

2. 辦理情形：(共計 2 件，執行情形如下表)

(1)計畫概述：本計畫分為南勢溪及南勢坑溪，南勢溪於適切點位設置簡易人工濕地設施，淨化污水，並導入生態工法的概念，增加底棲動物之棲地空間，並且活化整體環境，並滿足居民洗衣需求、設施及道路改善、兼顧水質淨化及水域休憩景觀之多重目標。另南勢坑溪透過水域環境的改善，將破除河道水泥化的三面工法，期能恢復自然的河川，藉以運用珍貴的水資源，活化湧泉清澈水質特色，並恢復適合生物棲息的友善環境，達到環境教育之目的，營造出南勢坑溪水岸新風貌。

(2)計畫期程：分 1 年執行(107 年)。

(3)執行情形：核定 2 件計畫，皆已完工。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度(%)	實際進度(%)	實支率(%)
1	南勢溪環境營造	2,500	100%	100%	100%
2	南勢坑溪水道環境改善	4,959	100%	100%	97% (因工程決算後小於核定總經費)

二、108 年辦理情形：中央核定共計 3 件，執行完成 0 件，辦理情形臚列如下：

(一) 東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：行政院環境保護署

(2) 中央補助計畫名稱：全國水環境改善計畫

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 2 億 1,000 萬元、本府自籌款新臺幣 9,000 萬元、總計新臺幣 3 億元

2. 辦理情形：(共計 1 件，執行情形如下表)

(1) 計畫概述：為改善東大溪水環境，以市府與東海大學攜手合作方式，由市府辦理改善工程，所需用地則由東海大學提供，透過建設水質現地礫間處理設施，進行全量處理後放流回河道，以改善生態環境。並在確保防洪安全前提下，營造水與綠的樂活空間，提供大眾親水、親綠的友善環境；而礫間設施亦可作為中小學環境教育場域。

(2) 計畫期程：共分 2 年執行(108~109 年)。

(3) 執行情形：核定 1 件計畫，目前刻正進行規劃設計作業，預計於 108 年底辦理工程發包，109 年底完工。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	核定日期	設計完成 日期	上網日期	決標日期	備註
1	東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫	30,000	108/6/28	-	108/4/2	108/7/1	設計中，原設計費由本預算支應，後獲中央同意補助。

(二) 旱溪排水水環境改善計畫

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：行政院環境保護署及經濟部水利署

(2) 中央補助計畫名稱：全國水環境改善計畫

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 1 億 300 萬元、本府自籌款新臺幣 4,414 萬 3,000 元，總計新臺幣 1 億 4,714 萬 3,000 元

2. 辦理情形：(共計 2 件，執行情形如下表)

(1) 計畫概述：延續上游 107 年核定案件，利用旱溪排水水利園區之地下空間設置一座 12,000CMD 之現地處理設施，淨化水質從嚴重污染改善至輕度污染，並於河道內設置堰壩，有利於輕艇等水上活動，促進本區水上運動發展。

(2) 計畫期程：共分 2 年執行(108~109 年)。

(3) 執行情形：核定 2 件計畫，預計 109 年底完成。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	核定日期	設計完成 日期	上網日期	決標日期	備註
1	旱溪排水水質 現地處理設施	14,000	108/6/28	-	108/5/10	108/7/2	設計中
2	旱溪排水水利 園區堰壩及結 合周邊環境營 造	714	108/6/28	-	-	-	採購中

【水環境建設－水與發展】

一、107 年辦理情形：中央核定共計 5 件，執行完成 4 件，辦理情形臚列如下：

（一）臺中市加強水庫集水區保育治理工程

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：行政院農業委員會水土保持局

(2) 中央補助計畫名稱：加強水庫集水區保育治理計畫

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 5,200 萬元(代辦經費)。

2. 辦理情形：(共計 4 件，執行情形如下表)

本計畫共核定 4 件，辦理和平區天輪里雞谷溪野溪整治工程(600 萬元)、石岡區龍興里食水崙溪支流旁崩塌地改善工程(500 萬元)、東勢區沙連溪古稀橋上游崩塌地護岸工程(2,900 萬元)等 3 件工程於 107 年 12 月底前完工；另外，和平區梨山里梨山段 68-2 地號旁野溪整治工程(1,200 萬元)於 108 年 5 月完工。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	預定進度 (%)	實際進度 (%)	實支率 (%)
1	和平區天輪里雞谷溪野溪整治工程(代辦案)	600	100%	100%	71%
2	和平區梨山里梨山段 68-2 地號旁野溪整治工程(代辦案)	1,200	100%	100%	0%
3	石岡區龍興里食水崙溪支流旁崩塌地改善工程(代辦案)	500	100%	100%	100%
4	東勢區沙連溪古稀橋上游崩塌地護岸工程(代辦案)	2,900	100%	100%	95%

（二）水湳水資源回收中心再生水工程(園區外)

1. 案件基本執行資料

(1) 中央主政機關：內政部營建署

(2) 中央補助計畫名稱：再生水工程推動計畫

(3) 經費：中央核定補助款新臺幣 6 億 8,000 萬元、本府自

籌款新臺幣 9,270 萬元、總計新臺幣 7 億 7,270 萬元

2. 辦理情形：(共計 1 件，執行情形如下表)

前瞻計畫(108 年 4 月 10 日修正版)原訂 108 年底前完成招商、110 年底完成興建開始供水，因再生水售水水價尚未能與中科管理局及用水人達成共識，故未能進入招商階段。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	核定日期	上網日期	決標日期	備註
1	水涵水資源回收中心再生水工程(園區外)	77,273	106/7/10	-	-	協商中

二、108 年辦理情形：中央核定共計 1 件，執行中，辦理情形臚列如下：

(一)臺中市智慧防汛網推廣建置計畫

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：經濟部水利署

(2)中央補助計畫名稱：推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫

(3)經費：中央核定補助款新臺幣 1,287 萬 5,000 元、本府自籌款新臺幣 282 萬 5,000 元、總計新臺幣 1,570 萬元

2. 辦理情形：(共計 1 件，執行情形如下表)

本計畫預計於 109 年底完成建置本市智慧防汛網，引進智慧物聯網新科技，例如智慧水尺以警戒值推播發布警訊，透過大數據的搜集與分析，以多維度觀點防災減災預警，打造都市智慧防災，以保障民眾的生命及財產安全，目前辦理發包作業中。

項次	名稱	核定總經費 (萬元)	核定日期	上網日期	決標日期	備註
1	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫	1,570	108/4/8	108/8/23	-	採購中

伍、觀光旅遊局執行前瞻基礎建設進度專案報告

一、107 年辦理情形：中央核定共計 7 件，執行完成 5 件，辦理情形臚列如下：

(一)東后豐自行車道及周邊基礎建設改善計畫

1. 案件基本執行資料

(1)中央主政機關：教育部體育署。

(2)中央補助計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」。

(3)經費：107 年 1 月 29 日中央核定補助款新臺幣 3,600 萬元，107 年 3 月 14 日臺中市議會同意墊付本府自籌款新臺幣 2,400 萬元，總計新臺幣 6,000 萬元。

(4)工程執行機關：臺中市政府觀光旅遊局。

(5)自行車道起訖點及長度：東后豐自行車道係由鐵道改建的自行車專用道，起點為國道 4 號橋下，后豐鐵馬道終點為后里馬場，東豐自行車綠廊終點東勢客家文化園區，沿途風光明媚，景色宜人，車道兩旁更有種植綠美化，沿線綠意昂然，更可體驗騎鐵馬過鐵橋、穿隧道的獨特感受，全長 16.5 公里。



2. 辦理情形：

(1)進度：本計畫因配合 2018 年臺中世界花卉博覽會開幕期程及工項性質，分為「東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程-坡道及路面改善工程」及「東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程-景觀及邊坡改善工程」兩案執行。

①「東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程-坡道及路面改善工程」於 107 年 08 月 02 日開工、107 年 12 月 22 日完工。

②「東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程-景觀及邊坡改善工程」於 107 年 9 月 6 日開工，目前工程施工

(2)主要施工項目:①自行車道坡度線型調整改善工程。②自行車道路面改善工程。③自行車道沿線欄杆修繕工程。④無障礙設施及休憩空間修繕整建工程⑤導覽地圖及里程碑更新工程⑥新設廁所工程等。





花梁鋼橋欄杆改善



無障礙設施及休憩空間修繕整建



新設廁所示意圖



導覽地圖更新

(二)大甲鐵砧山挑戰型自行車道建置工程

1. 案件基本執行資料


- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」。
- (3)經費：107 年 3 月 28 日中央核定補助款新臺幣 720 萬元，107 年 7 月 10 日臺中市議會同意墊付本府自籌款新臺幣 480 萬元，總計新臺幣 1,200 萬元。
- (4)工程執行機關：臺中市風景區管理所。
- (5)自行車道起訖點及長度：起點自大甲區經國路與中山路一段(環島一號線)路口，沿成功路至終點大甲鐵砧山國軍紀念公園，總長約 3 公里。

2. 辦理情形：

- (1)進度：本工程 107 年 11 月 26 日開工、108 年 4 月 24 日完工。
- (2)主要施工項目：①自行車道劃設及標線標誌工程。②新增自行車架。③新增廁所及既有廁所整修工程。④休憩點整修工程…等。



自行車道路線圖

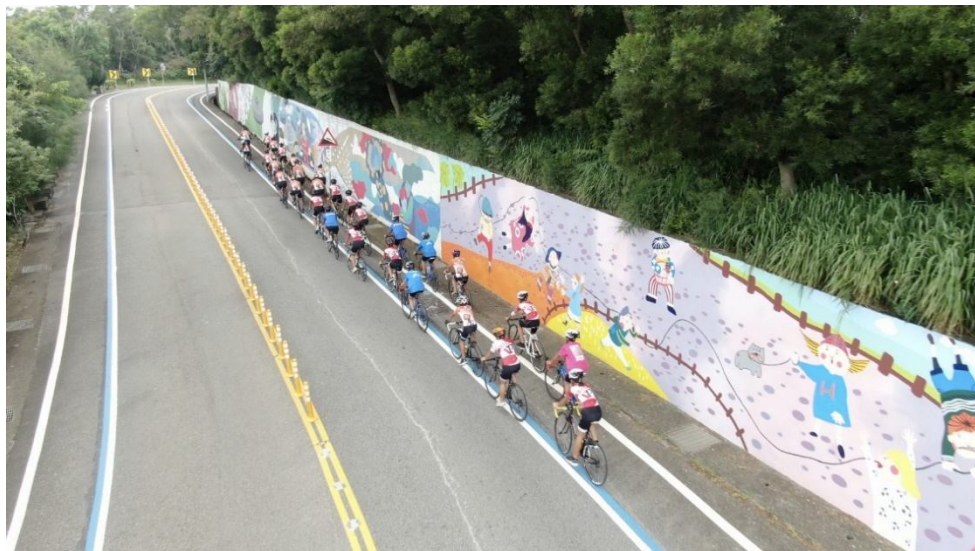

自行車道劃設及標線標誌



休憩點整修



新增廁所及既有廁所整修


(三)臺中市甲后線自行車道建置工程

1. 案件基本執行資料

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」。
- (3)經費：107 年 4 月 16 日中央核定補助款新臺幣 2,040 萬元，107 年 7 月 23 日臺中市議會同意本府自籌款新臺幣 1,360 萬元納入 107 年度第 1 次追加減預算，總計新臺幣 3,400 萬元。
- (4)工程執行機關：臺中市政府觀光旅遊局。
- (5)自行車道起訖點及長度：甲后線主線起點自后里泰安火車站，終點至大甲火車站，六分支線起點自花博外埔園區周邊，終點至外埔區公所，忘憂谷支線起點自月眉糖廠周邊，終點至大甲中山公園，總長共約 35.2 公里。

2. 辦理情形：

- (1)進度：107 年 12 月 1 日開工、108 年 5 月 29 日完工。
- (2)主要施工項目：①自行車道標線劃設工程。②自行車道指引標誌設置。③堤頂道路鋪面工程。④安全護欄設置…等。

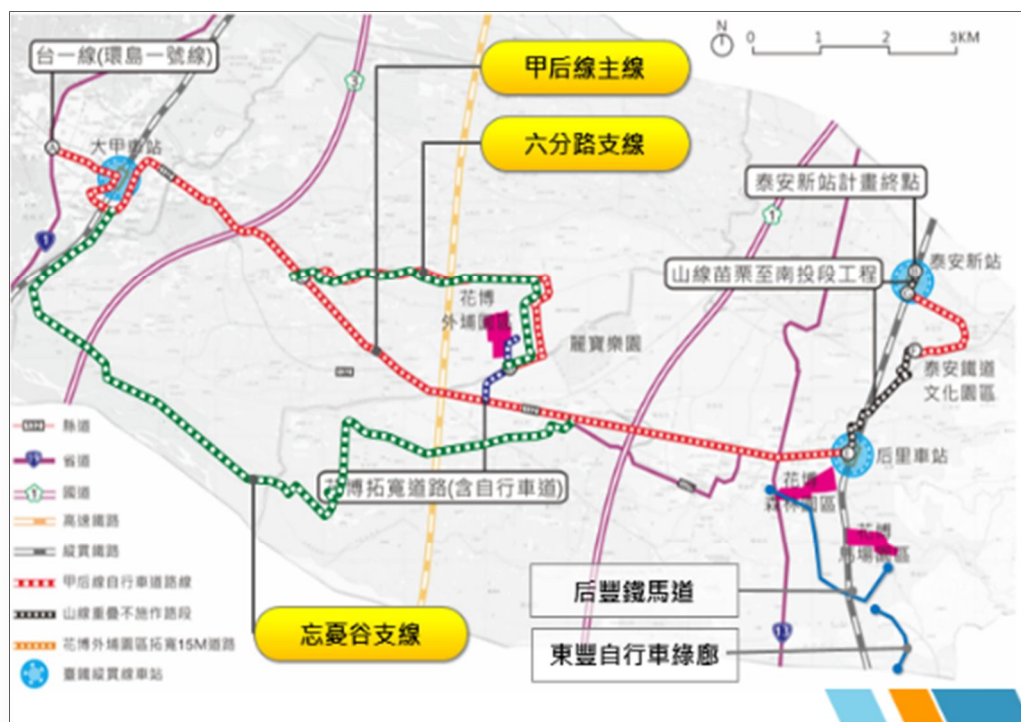

自行車道路線圖



堤頂自行車道



堤頂自行車道

(四)潭雅神綠園道基礎設施改善暨環島支線建置計畫

1. 案件基本執行資料

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」。
- (3)經費：107年6月13日中央核定補助款新臺幣2,100萬元，107年8月29日臺中市議會同意墊付本府自籌款新臺幣1,400萬元，總計新臺幣3,500萬元。
- (4)工程執行機關：臺中市政府觀光旅遊局。
- (5)自行車道起訖點及長度：潭雅神綠園道係由軍用舊鐵道神岡支線改建而成，為封閉型自行車專用道，沿線行經潭子、神岡、大雅，可連接中部科學園區，全長14公里。

2. 辦理情形：


- (1)進度：108年1月25日開工、108年9月4日完工。
- (2)主要施工項目：①休憩節點改善工程。②老舊欄杆及設施更換。③既有地坪及鋪面修繕。④路口夜間警示設置⑤本作設施整修⑥新設廁所等。



自行車道路線圖



老舊欄杆更換

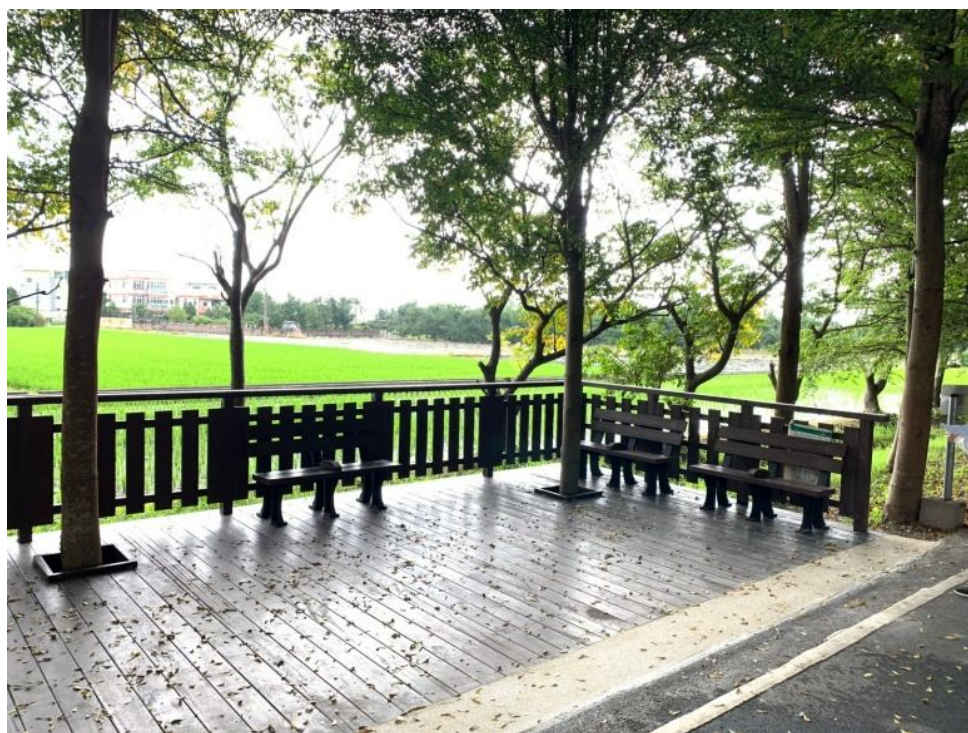

休憩節點改善



既有鋪面修繕



路口夜間警示設置



木作設施整修



新設廁所

(五)臺中市清水區臨港路、五福圳及清水自行車道整建計畫

1. 案件基本執行資料

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」。
- (3)經費：107 年 6 月 13 日中央核定補助款新臺幣 1,200 萬元，107 年 8 月 29 日臺中市議會同意墊付本府自籌款新臺幣 800 萬元，總計新臺幣 2,000 萬元。
- (4)工程執行機關：臺中市清水區公所。
- (5)自行車道起訖點及長度：五福圳自行車道起點自清水區中山路與中清路口，終點至臺中港火車站，臨港路自行車道起點自臺中港火車站，終點至臨港路與北堤路路口，清水自行車道起點自臨港路與華江北街路口，終點至清水區中山路與中清路口，總長約 17.9 公里。

2. 辦理情形：

- (1)進度：本工程 108 年 1 月 11 日開工、108 年 7 月 31 日完工。
- (2)主要施工項目：①自行車鋪面改善工程。②自行車道導引及標誌標線改善工程。③既有設施改善工程。④安全護欄設置…等。



自行車道路線圖



既有花架設施改善



安全護欄設置

(六)臺中市大安區自行車道路網改善工程

1. 案件基本執行資料

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」。
- (3)經費：107 年 6 月 25 日中央核定補助款新臺幣 2,880 萬元，107 年 8 月 29 日臺中市議會同意墊付本府自籌款新臺幣 1,920 萬元，總計新臺幣 4,800 萬元。
- (4)工程執行機關：臺中市大安區公所。
- (5)自行車道起訖點及長度：起點自大安區頂安海堤，至終點南埔海堤，新建自行車道長約 2.7 公里。

2. 辦理情形：

- (1)進度：本工程 108 年 1 月 20 日開工、施工進度 99%、預計 108 年 10 月 15 日完工。(新建自行車道長約 2.7 公里已於 108 年 9 月 22 日完成)
- (2)主要施工項目：①自行車鋪面改善工程。②自行車道導引及標誌標線改善工程。③觀景平台及既有廁所設施改善工程。④安全護欄設置…等。



自行車道路線圖



鋪面改善及安全護欄設置



既有廁所設施改善



觀景平台設施改善

(七)臺中市霧峰區乾溪自行車道(乾溪橋上游)工程

1. 案件基本執行資料

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」。
- (3)經費：107 年 6 月 25 日中央核定補助款新臺幣 1,500 萬元，107 年 8 月 29 日臺中市議會同意墊付本府自籌款新臺幣 1,000 萬元，總計新臺幣 2,500 萬元。
- (4)工程執行機關：臺中市霧峰區公所。
- (5)自行車道起訖點及長度：起點自霧峰區乾溪橋，至終點 921 地震園區，新建兩側堤防道路，左岸長 960 公尺、右岸長 1200 公尺的自行車道。

2. 辦理情形：

- (1)進度：本工程 107 年 11 月 20 日開工、108 年 3 月 28 日完工。
- (2)主要施工項目：①自行車鋪面改善工程。②自行車道導引及標誌標線改善工程。③景觀矮燈設施改善工程。④安全欄杆及各銜接自行車牽引道及斜坡道設置…等。



自行車道路線圖



乾溪堤頂自行車道

二、108 年辦理情形：中央核定共計 1 件，執行中，辦理情形如下：

(一)臺中市大里區草湖溪畔自行車道第三期建置計畫

1. 案件基本執行資料

- (1)中央主政機關：教育部體育署。
- (2)中央補助計畫名稱：「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫」項下子計畫「營造友善自行車道」。
- (3)經費：108 年 5 月 24 日中央核定補助款新臺幣 1,020 萬元，108 年 8 月 22 日臺中市議會同意墊付本府自籌款新臺幣 680 萬元，總計新臺幣 1,700 萬元
- (4)工程執行機關：臺中市政府觀光旅遊局。
- (5)長度：起點自大里區銀聯一橋，沿草湖溪北岸堤防，至終點建東路與建民路路口，總長約 1.48 公里。

2. 辦理情形：

- (1)進度：本工程教育部體育署 108 年 5 月 24 日核定經費，108 年 8 月 22 日臺中市議會同意墊付，設計監造勞務案 108 年 9 月 17 日決標，目前規劃設計中，工程預計 109 年 8 月完工。
- (2)主要施工項目：①自行車道鋪面改善工程。②自行車道導引及標誌標線改善工程。③休憩節點、座椅、自行車架設置工程。④安全欄杆及燈具設置…等。



自行車道模擬示意圖
